

ANEXO V: PLAN DE TRABAJO

EMPRESA:

MES BASE OBRA: (FECHA APERT)

MONTO OBRA: UVI


N°	DESCRIPCION DEL ITEM	INC. %	MESES							
TOTAL		100,00								
AVANCE FISICO	Mensual									
	Acumulado									
INVERSION	Mensual									
	Acumulado									

*El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión.

*En el Pliego de Especificaciones Técnicas se encuentra el detalle de ítems a llenar en el Plan de Trabajo y la forma de cotizar.

ANEXO V.a

CURVA DE INVERSIONES

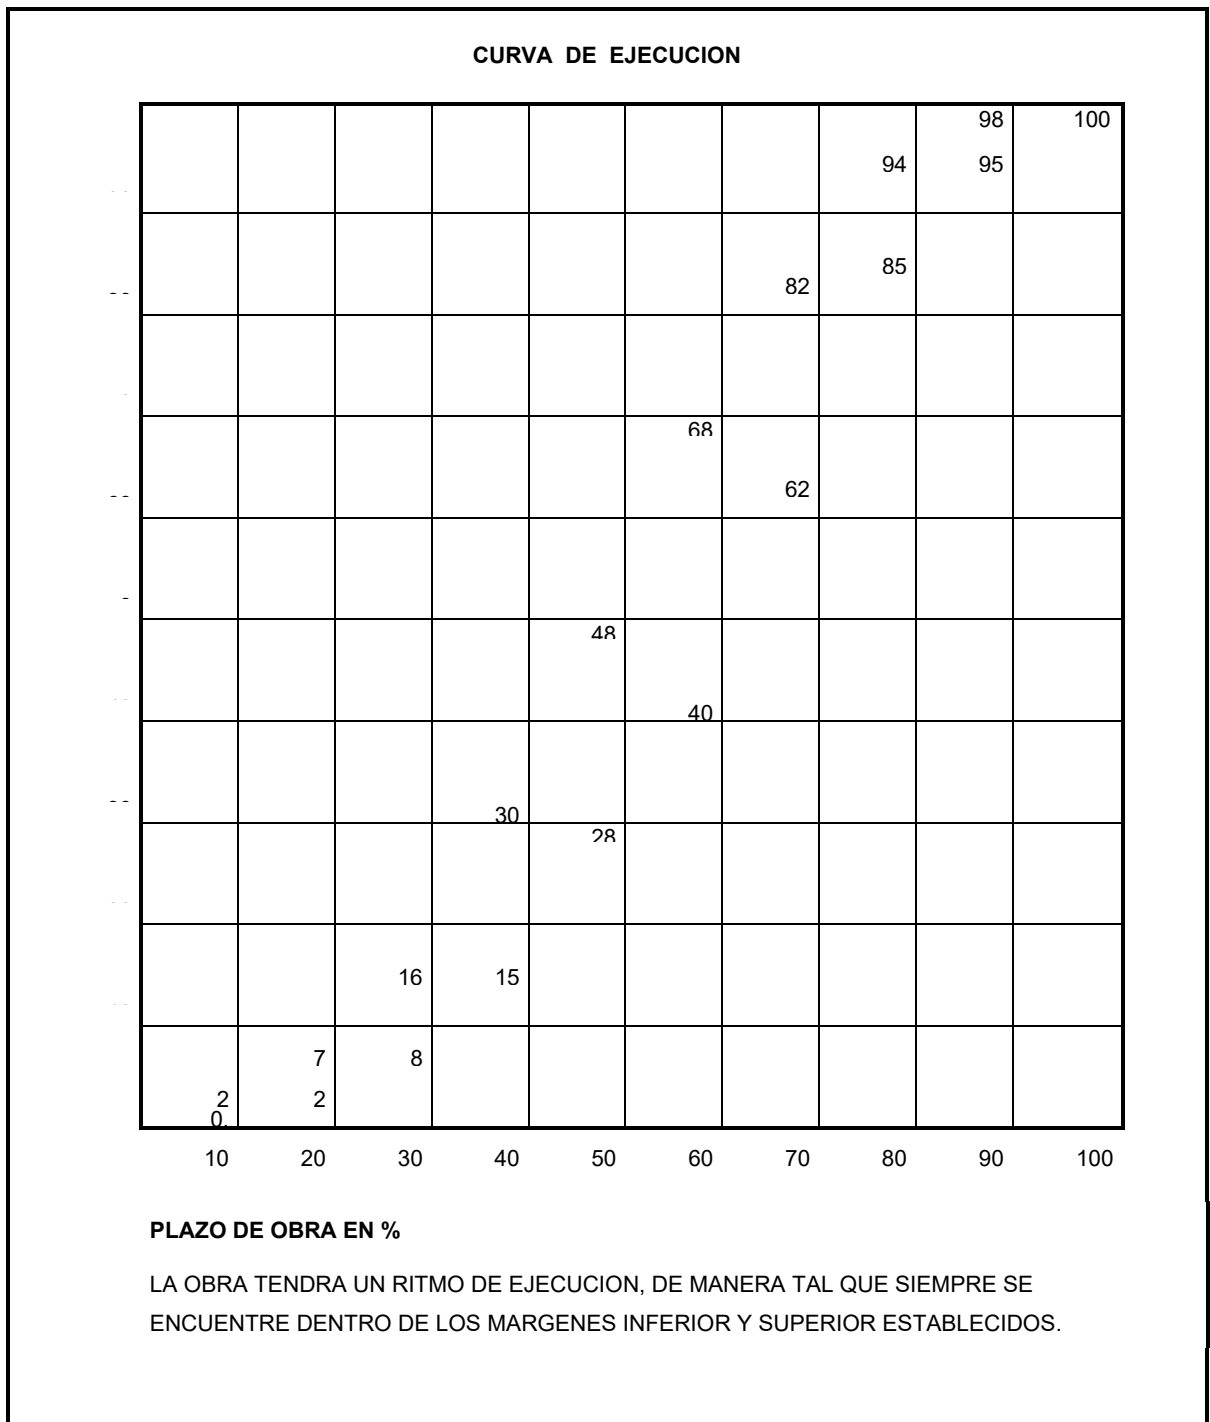

*El oferente deberá presentar un plan de trabajo y curva de inversión.

ANEXO VI

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO – CUADRO A

I.P.V. - Gerencia de Proyectos							
PRESUPUESTO PARQUE LINEAL PEREYRA ROZAS - ETAPA 3							
Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	INCID.
1	0 0 1	Limpieza y replanteo	gl	1,00			
2	0 0 2	Proyecto ejecutivo (documentacion tecnica)	gl	1,00			
3	0 0 3	Desmonte y terraplen a mano y máquina	m3	1116,80			
4	0 0 4	Cordón cuneta de HºAº	ml	1213,00			
5	0 0 5	Hº Aº fratazado e = 10 cm (caminerias)	m2	2960,00			
6	0 0 6	Hº para Rampas accesibilidad	m2	18,60			
7	0 0 7	Canteros de mamposteria (incluye aislacion)	gl	1,00			
8	0 0 8	Forestación	m2	8208,00			
9	0 0 9	Arbolado y plantas en general	gl	1,00			
10	0 1 0	Inst. sanitaria - agua fría (grifos)	UN.	15,00			
11	0 1 1	Juegos para la salud (kit completo de 4 juegos)	UN.	1,00			
12	0 1 2	Juegos para chicos (kit completo de 4 juegos)	UN.	1,00			
13	0 1 3	Juegos integradores (kit completo de 4 juegos)	UN.	1,00			
14	0 1 4	Cestos de basura	UN.	10,00			
15	0 1 5	Bancos premoldeados de Hº y madera	UN.	21,00			
16	0 1 6	Estacionamiento de bicicletas (metalicos)	UN.	8,00			
17	0 1 7	Alumbrado público (incluye tendido de red y artefactos completos LED)	UN.	74,00			
18	0 1 8	Limpieza general de obra	m2	11168,00			
		Subtotal 1				\$ -	
		Flete %				\$ -	
		Subtotal 2				\$ -	
		Gastos Generales %				\$ -	
		Subtotal 3				\$ -	
		Utilidad %				\$ -	
		Subtotal 4				\$ -	
		I.V.A. 21%				\$ -	
						\$ -	
		Precio total - fecha de Apertura				\$ -	
		Superficie de intervencion		11168			
		Precio x m2					

*Los ítems cotizados de forma global deberán ser detallados en forma desagregada en las planillas de análisis de precios.

ANEXO VII: ANALISIS DE PRECIOS

ANALISIS DE PRECIOS	A FECHA
----------------------------	---------

OBRA :

ITEM :

UNIDAD :

E	Q	DESIGNACION	U	CANTIDAD	\$ UNITARIOS	\$ TOTALES
	1					
	2					
	3					
P.	4					
TOTAL A						

M A T E R I A L E S	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
TOTAL B						

M-	28					
	29					
O	30					
	31					
R	32					
A	33					
TOTAL C						

COSTO DIRECTO (CD)	TOTAL D = A + B + C	
--------------------	---------------------	--

*El oferente deberá presentar un anexo VIII para cada ítem y/o rubro del presupuesto

ANEXO VIII: FORMULARIO DE PLANILLA DE COMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES E INDIRECTOS

Nº ORDEN	CONCEPTO	INCIDENCIA PORCENTUAL
1.-	Gastos Fijos	
1.1	Cartel de obra	
1.2	Cerco de obra	
1.3	Oficina de Inspección y Obrador	
1.4	Depósitos y talleres en obra	
1.5	Tasas y derechos de construcción e instalaciones	
1.6	Instalación de fuerza motriz	
1.7	Aval Propuesta	
1.8	Sellado Contrato	
1.9	Honorarios y gastos por estudio de propuesta	
1.10	Transporte e instalación de equipos y herramientas	
<u>Subtotal 1</u>		
2.-	Gastos a realizar durante la ejecución de la obra	
2.1	Gastos relacionados con la Inspección	
2.1.1	Movilidad Inspección (Amortización y mantenimiento)	
2.1.2	Combustibles y lubricantes movilidad Inspección	
2.1.3	Chofer movilidad Inspección	
2.1.4	Personal de apoyo a la Inspección	
2.1.5	Gastos de Inspección (Según monto requerido en pliegos)	
<u>Subtotal 2.1</u>		
2.2	Gastos por personal de apoyo y conducción	
2.2.1	Conducción Técnica	
2.2.2	Capataces	
2.2.3	Laboratoristas, topógrafos, mecánicos y otros auxiliares técnicos	
2.2.4	Choferes	
2.2.5	Serenos	
2.2.6	Administrativos	
2.2.7	Personal de conservación durante el período de garantía	
2.2.8	Seguro del personal de obra	
<u>Subtotal 2.2</u>		
2.3	Gastos por papelería, útiles, equipos y apoyo no personal	
2.3.1	Papelería y útiles	
2.3.2	Comunicaciones (correspondencia, teléfono, etc.)	
2.3.3	Movilidad p/personal (Amortización y mantenimiento o alquiler)	
2.3.4	Combustibles y lubricantes (p/traslado de personal)	
2.3.5	Servicios (energía, agua, cloacas, etc.)	
2.3.6	Equipamiento oficina (Amortización)	
2.3.7	Seguros (excluido el del personal)	
2.3.8	Aval Contrato	
2.3.9	Financiación (Descuento de certificados, fondos de reparo, etc.)	
<u>Subtotal 2.3</u>		
<u>Subtotal 2 (2.1 + 2.2 + 2.3)</u>		
<u>Total Gastos Generales e Indirectos</u>		100,00

*El oferente deberá presentar un anexo VIII

ANEXO IX
PLANILLA PARA LISTADO DE MATERIALES

PLAZAS Y ESPACIOS VERDES

N°	MATERIALES	UN.	CANT.	TIPO Y/O CALIDAD	MARCA

* El oferente deberá presentar un anexo IX.

*EL IPV SE RESERVA EL DERECHO DE ELEGIR TIPO Y MARCA DE LOS MATERIALES QUE SE HAYAN OMITIDO EN ESTE LISTADO, ASEGURANDO CALIDAD
